

INFORME DE TRABAJOS EN LAGO DE MANZANARES



LAGO DE MANZANARES

INDICE

OBJETIVO DEL INFORME	3
RESUMEN DEL MES DE AGOSTO	3
RED ELÉCTRICA.....	4
RED CLOACAL	6
RED DE AGUA POTABLE.....	7
SEGURIDAD	8
MANTENIMIENTO	10
AGRIMENSURA / TOPOGRAFÍA	11
VIALIDADES	12
AMENITIES.....	12
PROYECTOS	13

OBJETIVO DEL INFORME

El objetivo del presente informe es presentar un resumen mensual del mes de Agosto que contemple las tareas desarrolladas en el Barrio Lago de Manzanares, con los participantes involucrados en cada tarea ejecutada y una actualización de lo que ha sucedido durante el mes en cuestión.

RESUMEN DEL MES DE AGOSTO

Principales avances:

- Se continúa avanzando con el recupero de la Red de Alumbrado Público
- Se continúa con las tareas de mantenimiento y limpieza general del predio
- Se continúa con la plantación de árboles en el Sector Norte del barrio.
- Comenzaron con la reparación de pilares domiciliarios de la Etapa Norte
- Se continúa avanzando con la reparación de tramos de Red Cloacal inoperativos.
- Se ha comenzado con la construcción del área deportiva del barrio
- Se ha comenzado con la construcción del SUM del barrio

Temas a considerar:

- La planta de tratamiento cloacal y estaciones de bombeo todavía no están operativas. En la proximidad se licitará la obra de ampliación y será posible equipar ambos sistemas.
- La red cloacal sigue reparándose en el sector izquierdo del barrio, por lo que el paso de vehículos está reducido.
- La presión de agua en la red se mantiene estable para la cantidad de usuarios hoy en día. Hay pérdidas en el sistema pendiente de reparo.
- Edenor y Rowing han avanzado con mejoras en el servicio tras reclamos del barrio y de la Dirección de Obra. Hay diálogo con la distribuidora para coordinar las tareas en el servicio.
- En breve se terminará con el cercado del perímetro correspondiente a la Etapa Norte. Luego se continuará con el resto del barrio.
- Han comenzado las tareas de reparación de pilares domiciliarios.
- En la brevedad se iniciará con la repavimentación del barrio en la Etapa Norte, por lo que se espera movimiento de suelos en el sector.

RED ELÉCTRICA

CONCEPTO	EMPRESA/CONTRATISTA	ESTADO
Reparación de pilares existentes	C&G	En proceso
Reparaciones de la red de alumbrado	TECNAO	En proceso
Reparación del suministro de energía eléctrica	Edenor	En proceso

Imágenes:

RED ELÉCTRICA Y RED DE ALUMBRADO	
Calle alumbrada	Farola Nueva Montada
	
Pilar revocado por C&G	Pilar intervenido por Edenor
	

Pilares intervenidos	Interior de buzón de fusibles central
	

Notas:

Durante agosto se han realizado varias visitas de parte de la distribuidora de electricidad en la zona tras reclamos por fallas en el suministro. Han reacondicionado uno de los buzones del barrio que acomete al transformador de media tensión cercano (reponiendo fusibles) y han reparado varios “riesgos eléctricos” que se advirtieron previamente. Quedan varias tareas por realizar, pero se ha establecido un diálogo con la distribuidora (tanto con Edenor como con Rowing).

Por otra parte, C&G ha comenzado las tareas de puesta en valor de los pilares de iluminación del barrio. Se avanzó con la limpieza de los mismos, revoque exterior, colocación de corrugado en casos que sea necesario, etc. (por ahora se realiza el revoque de los mismos y posteriormente se realizará la terminación). Al momento han concretado avances en lo que es la zona izquierda del barrio y comenzaron con la zona derecha recientemente.

A su vez, se continúan las tareas de reparación de la red de alumbrado en el barrio por parte de TECNAO. Se han colocado farolas de iluminación nuevas en toda la zona central del barrio y se han colocado farolas también en la zona lindera al arroyo Las Flores. Hay previstos trabajos de zanjeo para reparar tramos no funcionales, por lo que se espera un plan de trabajo para ello. Hay varios conductos que se encontraron mal ejecutados y se va reparando por fase intervenida a medida que avanzan con la puesta en valor.

Desde dirección de obra les pedimos que se le permita trabajar a ambas contratistas (C&G y TECNAO) durante el día. En caso de necesitar intervención en farolas alimentadas por las casas o en los pilares con medidores activos, se le notificará debidamente a los vecinos.

RED CLOACAL

CONCEPTO	EMPRESA/CONTRATISTA	ESTADO
Normalización de la red cloacal	SIDCO	En proceso
Equipamiento de Plante de Tratamiento y Estación Elevadora	INGENAT	En proceso
Obra Civil en la PTE	A definir	En licitación

Imágenes:

Acopio de materiales en la cercanía de la obra cloacal	
	
Zanjeo y tendido de tramo cloacal	
	

"Cojinete" ejecutado	Sedimentadores existentes en la PTE
	

Notas:

Se está pronto a concluir las tareas de reparación del tramo cloacal cercano a la rotonda. Se prevén trabajos en la calle central que culmina en la Planta de Tratamiento, por lo que se recomienda evitar el paso por la zona. Además, se efectuarán reparaciones aisladas en partes del barrio con cañerías mal ejecutadas. Las zonas quedan señalizadas por lo que se pide precaución al circular.

Ya se cuentan con los equipos necesarios para poder utilizar la Planta de Tratamiento y ambas Estaciones Elevadoras. No se traerán al barrio aún ya que no se encuentra totalmente cercado el sector.

En la brevedad se enviará la licitación para la obra civil a realizar en la planta de tratamiento, que permitirá aumentar la capacidad de efluentes a tratar. Será necesario un laberinto de cloración nuevo, un sedimentador funcional y un digestor de lodos nuevo. Ya se cuenta con el proyecto estructural, resta ultimar detalles del sistema de tratamiento planteado.

RED DE AGUA POTABLE

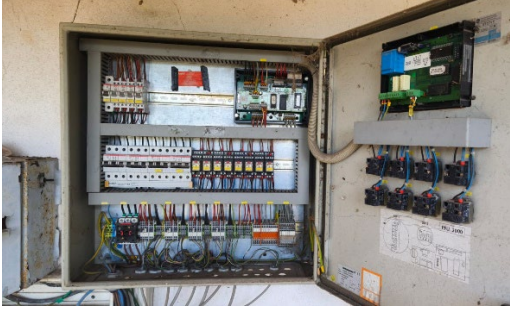
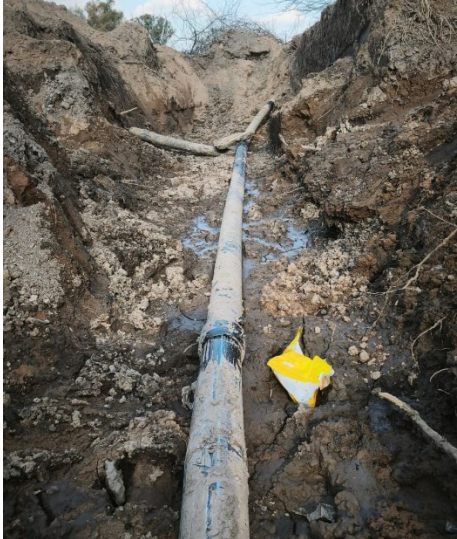
CONCEPTO	EMPRESA/CONTRATISTA	ESTADO
Reparación de pérdidas puntuales en la red – Zona Norte	MH y SIDCO	En proceso

Notas:

Tras varias reparaciones de la red de agua, se han encontrado las últimas fallas y en primera instancia parecieran no haber más detecciones. Por lo pronto, la presión de la red permanece estable con la bomba sumergible instalada.

Se ha realizado un relevamiento de la red y se han encontrado discrepancias con los planos existentes del barrio. Por ello, se realizará un relevamiento en detalle de la red existente para corregir la documentación.

Imágenes:

Estado del cuarto de bombeo	
	
Conexión troncal reparada	Conexión troncal reparada
	

SEGURIDAD

CONCEPTO	EMPRESA/CONTRATISTA	ESTADO
Cercado del perímetro	LEGUIZAMÓN ALAMBRADOS	En proceso
Sistema de Seguridad Integral	A definir	En licitación

Notas:

Se ha enviado la licitación para el servicio de seguridad integral en el barrio a distintos contratistas y se esperan propuestas técnicas y económicas. Se buscarán opciones de

videovigilancia, monitoreo y control de accesos y demás cuestiones relacionadas a la seguridad del barrio, acorde al proyecto Lago de Manzanares.

Se continúan con las tareas de cercado en el perímetro del barrio. Han cercado aproximadamente 3500 metros lineales de alambrado perimetral y hay unos 2200 metros amurados. Resta una parte para completar toda la Etapa 1.

Imágenes:

Portón de acceso instalado	Frente del barrio cercado
	

Trabajos de Cercado en el perímetro del barrio	
	

A su vez, se tiene un acopio de materiales generales en las cercanías de la entrada del predio, dónde se tiene vigilancia cercana en la mayor parte del día. Aquí se irán almacenando materiales que resulten necesarios para las tareas a desarrollar.



Acopio de materiales y Emplazamiento de obradores

MANTENIMIENTO

CONCEPTO	EMPRESA/CONTRATISTA	ESTADO
Parquización	MANTENIMIENTO DÍAZ	En proceso
Limpieza Zona Sur	ND Vial	En proceso
Paisajismo	Be Garden	En proceso

Imágenes:

Imágenes del avance de mantenimiento en Zona Norte y plantación	
	



Notas:

Se continúa con trabajos de mantenimiento y desmalezamiento en toda la Zona Norte del desarrollo.

Se han realizado limpiezas en la cercanía del arroyo Las Flores de manera momentánea, para mejorar la circulación. Tras un relevamiento efectuado del arroyo, se han detectado desniveles importantes en el fondo que perjudican la circulación aguas abajo. Se deberán realizar mejoras en este arroyo para favorecer el desagüe.

Se continúa trabajando en el sector Sur del barrio, realizando la limpieza de este para intervenirlo posteriormente, con un movimiento de suelos acorde. Esta tarea llevará un tiempo considerable, por lo que se pide no circular por la zona Sur del barrio dado que habrá máquinas trabajando constantemente. Se ha colocado señalización para impedir el movimiento.

Se continúa con la ejecución del proyecto paisajístico tras concretar la plantación de más de 700 árboles en los frentes de lote. Además, se han realizado plantaciones de árboles en diversos sectores verdes de la Etapa Norte.

AGRIMENSURA / TOPOGRAFÍA

Se han marcado con estacas los límites del cerco por lo que se pide precaución al circular por el perímetro del predio. Por otro lado, los puntos fijos que se ven en el barrio están siendo utilizados como referencia por varias contratistas.

Puntos Azules: Puntos Fijos para efectuar el relevamiento topográfico.

Estacas de madera: Delimitación del cerco perimetral.

Se muestra un ejemplo:



Se avanza con gestiones municipales y provinciales para poder contar con la documentación necesaria en todos los lotes del barrio (tanto para la Etapa Norte como para la Etapa Sur).

VIALIDADES

CONCEPTO	EMPRESA/CONTRATISTA	ESTADO
Proyecto Vial – Zona Norte	PEESA	Completado
Proyecto Vial – Zona Sur	PEESA	En proceso
Vialidades internas – Zona Norte	ZAMVIAL + GRANT	En proceso

Se ha adjudicado la obra de vialidades internas de la Etapa Norte del barrio a la empresa ZAMVIAL. Esto incluye el retiro del asfalto existente, confección de nuevo paquete estructural con base de suelo cemento, relleno con suelo seleccionado A4, compactado y perfilado. Además, se realizará una nueva carpeta asfáltica acorde. Por último, se prevén cordones emergentes de hormigón en sectores seleccionados y ejecución de zanjas pluviales según el proyecto hidráulico aprobado.

Dado que se trata de una obra de gran envergadura, se realizarán las comunicaciones acordes para notificar los sectores por los que se irá avanzando. Desde la Dirección de Obra enviaremos una secuencia de calles a intervenir para notificar a los vecinos la circulación recomendada de manera temporal.

AMENITIES

CONCEPTO	EMPRESA/CONTRATISTA	ESTADO
Canchas de tenis y pádel	Marino Tenis	En proceso
Cancha de fútbol	Díaz Mantenimiento	En proceso
SUM	Construcciones Báez	En proceso

Notas:

Hacia finales del mes de agosto se ha comenzado a delimitar lo que serán algunas de las amenities que ofrecerá el barrio como parte de su refuncionalización. Con este motivo, se ha demarcado y rellenado una cancha de fútbol en las cercanías a la entrada del barrio. Resta una nivelación y compactación, junto con un perfilado, para poder tener el paquete conformado. Luego de esto, se continuará con la demarcación y el amure de los arcos ya acopiados en la obra.

En sintonía con esto, se ha contratado la construcción de 2 canchas de pádel con césped sintético y 2 canchas de tenis del tipo rápidas. Estas se hallarán en frente al futuro House proyectado y conformarán el primer avance en lo que será la zona común del barrio, dónde se espera un lugar de encuentro y actividad social a futuro entre todos los vecinos de la comunidad.

En la misma línea, se ha contratado la puesta en valor del edificio que previamente funcionaba como vestuario en el barrio. El proyecto contempla la demolición del interior y reutilizar la estructura original para realizar un SUM (Salón de Usos Múltiples) con vista a las canchas de fútbol. Tendrá cocina, baños y un depósito de almacenamiento pequeño. Contará con una galería descubierta y también con una terraza transitable, todo acorde a la estética del barrio a futuro.



Relleno de cancha de fútbol y estado actual del SUM

PROYECTOS

- Edificio de acceso principal
- Planta de Tratamiento
- House

Se están realizando las gestiones acordes para comenzar con las intervenciones civiles de las obras anteriormente mencionadas. Se avanza en conjunto con profesionales (Arquitectos, calculistas, etc.) para tener un proyecto conformado que cumpla con la estética y los requerimientos del barrio a futuro.

La Planta de Tratamiento de Efluentes comenzará su obra en la brevedad. Secuencialmente lo harán el edificio de acceso principal y el House proyectados, pendientes de aprobaciones municipales para su realización.



Edificio de entrada en la actualidad
