

INFORME DE TRABAJOS EN LAGO DE MANZANARES



LAGO DE MANZANARES

INDICE

OBJETIVO DEL INFORME	3
RESUMEN DEL MES DE MAYO	3
RED ELÉCTRICA	4
RED CLOACAL.....	5
RED DE AGUA POTABLE.....	7
SEGURIDAD.....	9
MANTENIMIENTO	11
AGRIMENSURA / TOPOGRAFÍA.....	12
VIALIDADES.....	13

OBJETIVO DEL INFORME

El objetivo del presente informe es presentar un resumen mensual del mes de Mayo que contemple las tareas desarrolladas en el Barrio Lago de Manzanares, con los participantes involucrados en cada tarea ejecutada y una actualización de lo que ha sucedido durante el mes en cuestión.

RESUMEN DEL MES DE MAYO

Principales avances:

- Colocación de motores para el portón de la entrada.
- Confección del proyecto de vialidades internas en el barrio
- Se continúa con las tareas de mantenimiento y limpieza general del predio
- Se continúa con la colocación de un nuevo cerco perimetral.
- Se terminó con el desmonte de la zona Sur del barrio.
- Se finalizó la puesta en servicio de la red cloacal y se esperan reparaciones mayores en el corto plazo.
- En el corto plazo se comenzará con la reparación de la red de alumbrado
- Se siguen encontrando pérdidas de agua menores y se van reparando a medida que aparecen
- Se avanzó con trabajos de agrimensura y topografía en el barrio.

Temas a considerar:

- La planta de tratamiento cloacal y estaciones de bombeo todavía no están operativas.
- Hay 760 metros de red cloacal a ser reparados en el corto plazo, junto con acometidas domiciliarias menores.
- La red de agua presenta pérdidas que deben repararse.
- Tanto la red eléctrica como el alumbrado público presentan fallas.
- El cercado del barrio avanza y estarán haciendo tareas en fondos de lotes en la proximidad.

RED ELÉCTRICA

CONCEPTO	EMPRESA/CONTRATISTA	ESTADO
Relevamiento del tendido eléctrico existente - Zona Norte	TECNAO	Completado
Relevamiento de pilares existentes	-	Completado
Reparaciones de la red de alumbrado y provisión de farolas – Zona Norte	A definir	En licitación
Reparación del suministro de energía eléctrica	Edenor	En proceso

Imágenes:

Estado actual de la red eléctrica	
Intervención de Edenor	Pilar deshabilitado por Edenor
	

Notas:

Se ha realizado un relevamiento extenso de todos los pilares del barrio, teniendo un detalle de la estructura de cada uno, existencia de peligros eléctricos, existencia de avispas/abejas, etc. Con el detalle, se enviará el estado de cada uno a Edenor para que efectúen las tareas pertinentes y realicen intervenciones acordes. Sigue el trabajo en conjunto para traer la mejor solución al estado de la red.

Se han recibido ofertas por la reparación de la red de alumbrado público en el barrio, que incluirá la intervención en farolas dañadas o inexistentes y la normalización del cableado subterráneo de conductores eléctricos. También, se repararán los tableros de comando general de alumbrado, como demás intervenciones menores necesarias en la entrada del barrio.

RED CLOACAL

CONCEPTO	EMPRESA/CONTRATISTA	ESTADO
Relevamiento de las bocas de inspección y prueba hidráulica de la red – Zona Norte	BROCA	Completado
Puesta en servicio de la red cloacal – Zona Norte	BROCA	Completado
Vaciado de la planta de tratamiento de efluentes y estaciones elevadoras - Norte	BROCA	Completado
Normalización de la red cloacal– Zona Norte	A definir	En licitación
Equipamiento de Plante de Tratamiento y Estación Elevadora – Zona Norte	A definir	En licitación

Imágenes:



	
Planta de Tratamiento y Estaciones Elevadoras	
	



Notas:

Se ha completado la puesta en servicio de la red de cloacas. Dentro de estas tareas, se incluyó la desobstrucción de toda la red cloacal perteneciente a la zona norte (desobstrucción de bocas de registro enterradas y superficiales, reparación de tramos intermedios de cañería, reacondicionamiento de tapas de inspección de arranque, materialización de bocas de registro en lugares puntuales).

Como paso siguiente, se ha licitado la reparación de anomalías mayores en la red, como lo es la reparación de 760m de cañería, materialización de nuevas bocas de registro y cámaras de inspección y limpieza y extensiones de conexiones domiciliarias cloacales.

Se considera que la planta de tratamiento y la estación elevadora cuentan con una infraestructura civil óptima, que se readecuará a las condiciones actuales. Ya se están considerando opciones para un correcto funcionamiento del tratamiento de efluentes en la zona existente del barrio. La planta se equipará completamente cuando las condiciones de electricidad y seguridad sean adecuadas para los equipos, por lo que se está pendiente a la finalización del cercado e implementación de seguridad acorde.

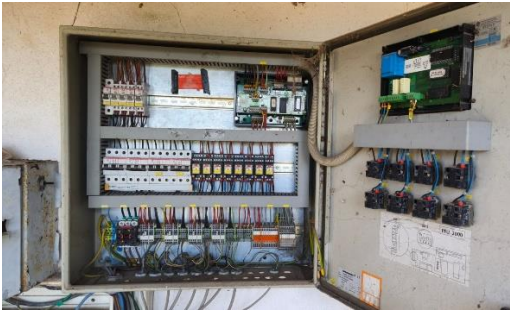
RED DE AGUA POTABLE

CONCEPTO	EMPRESA/CONTRATISTA	ESTADO
Reparación de pérdidas puntuales en la red – Zona Norte	MH	En proceso
Reparación de Hidrantes – Zona Norte	MH	Completado

Notas:

Tras algunas pruebas de la red, se han detectado pérdidas puntuales en conexiones domiciliarias y en troncales de la red. Con el aumento de presión seguirán apareciendo más pérdidas que se irán corrigiendo a medida que sean visibles. Desde Dirección de Obra pedimos que avisen de pérdidas visibles en el barrio.

Imágenes:

Estado del cuarto de bombeo	
	
Hidrante reparado	Hidrante reparado de la red
	

Tablero nuevo de la bomba sumergible



SEGURIDAD

CONCEPTO	EMPRESA/CONTRATISTA	ESTADO
Automatización de portones de entrada – Zona Norte	KARTOS	Completado
Cercado del perímetro del cerco – Zona Norte	LEGUIZAMÓN ALAMBRADOS	En proceso
Instalación carteles “Prohibido Bañarse”	DÍAZ MANTENIMIENTO	Completado
Sistema de Seguridad Integral – Norte y Sur	A definir	En licitación

Notas:

Se han instalado los motores para la apertura automática de los portones de entrada. Resta normalizar el suministro eléctrico en la entrada para habilitar su uso, que está incluido en la licitación mencionada previamente.

Han continuado las tareas de cercado en el perímetro del barrio. Se trata de un cerco con malla electrosoldada de 2mts con 2 líneas de púas. Estos irán colocados con murete de hormigón para evitar el hurto. La contratista avanza en zonas liberadas y a la par se despejan zonas futuras. Estarán trabajando en fondos de lotes por lo que se despejará la zona que no es parte del lote de cada propietario.

Se ha enviado la licitación para el servicio de seguridad integral en el barrio a distintos contratistas y se esperan propuestas técnicas y económicas. Se buscarán opciones de videovigilancia, monitoreo y control de accesos y demás cuestiones relacionadas a la seguridad del barrio, acorde al proyecto Lago de Manzanares.

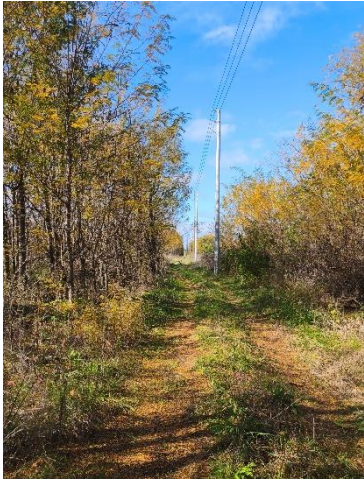
Imágenes:

Motores instalados en la entrada 	Acceso al cuarto de bombeo actual 
Vista a la laguna en la actualidad 	Trabajo de cercado en el barrio 
Trabajos de Cercado en el perímetro del barrio	
	

MANTENIMIENTO

CONCEPTO	EMPRESA/CONTRATISTA	ESTADO
Parquización– Zona Norte	MANTENIMIENTO DÍAZ	En proceso
Fumigación – Norte y Sur	PyP	Completado
Limpieza con retroexcavadoras – Norte y Sur	American Vial	En proceso

Imágenes:

Imágenes del avance de mantenimiento y desmonte de zona sur	
	
	

Notas:

Se ha completado la fumigación del predio contra las malezas y hojas anchas. En paralelo se realizan tareas con una mini pala, camión y máquina Giro Cero para coleccionar la suciedad generada debido a los trabajos de desmalezamiento.

Por otro lado, se ha completado el desmonte de la zona sur del barrio, por lo que pronto se realizará la limpieza del mismo.

A su vez, habrá retroexcavadoras circulando por los márgenes del arroyo y de la laguna, que se encargarán de la limpieza de estos. Con el arroyo despejado, se podrá continuar con el cercado del perímetro en esas zonas.

AGRIMENSURA / TOPOGRAFÍA

Se han avanzado con demarcación de puntos fijos a lo largo de todo el barrio que luego serán útiles para trabajos de topografía. Desde dirección de obra pedimos mantener la integridad de esos puntos fijos ya que luego resultaría complejo materializar medidas sin ellos.

Puntos Naranjas: Delimitación del cerco perimetral.

Puntos Azules: Puntos Fijos para efectuar el relevamiento topográfico.

Se muestra un ejemplo:



CONCEPTO	EMPRESA/CONTRATISTA	ESTADO
Relevamiento topográfico – Norte y Sur	Iraola Proyectos	En proceso
Agrimensura – Norte y Sur	J.C Méndez Casariego	En proceso

Por otro lado, pronto se completará el relevamiento de todo el barrio (Etapas Norte y Sur) para tener la superficie del predio delimitada y poder realizar los trabajos de movimiento de suelo correspondiente.

VIALIDADES

CONCEPTO	EMPRESA/CONTRATISTA	ESTADO
Proyecto Vial – Zona Norte	PEESA	Completado

A fines de mayo hemos recibido el proyecto de red vial propuesto por la contratista, que define el paquete estructural a considerar para el pavimento. También, quedan definido los radios de giro, longitudes, pendientes y anchos de calzada, entre otros elementos geométricos necesarios.

Se han enviado probetas de suelo a ensayar para determinar si es apto o no para ser utilizado como relleno granular y se realizarán más ensayos de este suelo para conocer sus características estructurales.
