

INFORME DE TRABAJOS EN LAGO DE MANZANARES



INDICE

OBJETIVO DEL INFORME	3
RESUMEN DEL MES DE JULIO	3
RED ELÉCTRICA	4
RED CLOACAL.....	5
RED DE AGUA POTABLE.....	7
SEGURIDAD.....	8
MANTENIMIENTO	10
AGRIMENSURA / TOPOGRAFÍA.....	11
VIALIDADES.....	12
PROYECTOS.....	12

OBJETIVO DEL INFORME

El objetivo del presente informe es presentar un resumen mensual del mes de Julio que contemple las tareas desarrolladas en el Barrio Lago de Manzanares, con los participantes involucrados en cada tarea ejecutada y una actualización de lo que ha sucedido durante el mes en cuestión.

RESUMEN DEL MES DE JULIO

Principales avances:

- Se instaló la conexión para los portones del barrio
- Se avanzó con trabajos en la red de alumbrado público
- Se continúa con las tareas de mantenimiento y limpieza general del predio
- Se continúa con la colocación del cerco perimetral, ya se avanzaron 2000 metros.
- Se han plantado 730 árboles a lo largo del barrio, en los frentes de lotes.
- Se instaló un sistema de riego en el barrio para mantener a los árboles plantados.
- Se siguen reparando tramos de red cloacal en sectores específicos.
- Se siguen identificando pérdidas de agua menores, pero la presión en la red se mantiene

Temas a considerar:

- La planta de tratamiento cloacal y estaciones de bombeo todavía no están operativas. Recientemente se ha contratado el equipamiento y se licitará el proyecto de ampliación.
- Hay 760 metros de red cloacal que están siendo reparados actualmente, recomendamos circular con cuidado en la zona señalizada.
- Se reparan las pérdidas de agua conforme se van encontrando. La red ya cuenta con una presión estable igualmente.
- Edenor ha realizado varias visitas al barrio corrigiendo anomalías que se han presentado. Se esperan futuras reparaciones, pero no tenemos control sobre la distribuidora ni sus horarios.
- El cercado del barrio avanza y se esperan en la proximidad los portones para cerrar completamente el perímetro. También se hará un cruce al arroyo para atravesar el cerco
- Se comenzarán a reparar pilares en breve, tanto estéticamente como eléctricamente.
- Ya contamos con el proyecto vial para la repavimentación del barrio.

RED ELÉCTRICA

CONCEPTO	EMPRESA/CONTRATISTA	ESTADO
Reparación de pilares existentes	C&G	En proceso
Reparaciones de la red de alumbrado y provisión de farolas – Zona Norte	TECNAO	En proceso
Reparación del suministro de energía eléctrica	Edenor	En proceso

Imágenes:

RED ELÉCTRICA Y RED DE ALUMBRADO	
Comparativa de Iluminación Actual vs Anterior	Farola Nueva Montada
	
Pilar intervenido por Edenor	Pilar intervenido por Edenor
	

Notas:

Se han realizado varias visitas de parte de la distribuidora de electricidad en la zona durante Julio, particularmente en las últimas 2 semanas del mes tras varios reclamos de fallas en el suministro. Han realizado arreglos parciales en algunos pilares detectados con riesgo eléctrico y seguirán con cuadrillas en el barrio, relevando las fallas de la red y reparando aquellos pilares con deterioro.

Por otra parte, C&G será la encargada de realizar la reparación de pilares existentes en el barrio. Entre las tareas, se incluye la limpieza de los mismos, reparación de componentes eléctricos, adecuación del habitáculo del medidor, reemplazo de caños corrugados internos deteriorados, etc. Además, se les efectuará una terminación acorde a una estética del barrio.

A su vez, se continúan las tareas de reparación de la red de alumbrado en el barrio. Los portones de entrada y salida están operativos (resta corregir el portón de proveedores que en breve será atendido). Por otra parte, se van colocando tanto farolas nuevas como farolas reparadas y repintadas en el barrio, intentando no dejar oscuros sectores con viviendas o calles transitadas. Se irá trabajando con circuitos en la medida que sea posible, montando farolas consecutivas.

Desde dirección de obra les pedimos que se le permita trabajar a ambas contratistas (C&G y TECNAO) durante el día. En caso de necesitar intervención en farolas alimentadas por las casas o en los pilares con medidores activos, se le notificará debidamente a los vecinos.

RED CLOACAL

CONCEPTO	EMPRESA/CONTRATISTA	ESTADO
Normalización de la red cloacal– Zona Norte	SIDCO	En proceso
Equipamiento de Plante de Tratamiento y Estación Elevadora – Zona Norte	INGENAT	En proceso

Imágenes:

	
Anillos premoldeados para cámaras de inspección	Colocación de anillos premoldeados
	
Tramo de cañería colocado y compactado	Sedimentadores existentes en la PTE



Notas:

Se continúa con las tareas de reparación en la red cloacal. Son aproximadamente 760 metros de cañería a reconstituir (en el lado derecho del barrio). Además, se efectuarán reparaciones aisladas en partes del barrio con cañerías mal ejecutadas. Las zonas quedan señalizadas por lo que se pide precaución al circular.

Se ha contratado el equipamiento de la Planta de tratamiento de Efluentes y de ambas estaciones elevadoras. Se traerán bombas elevadoras, difusores de aire, una turbina de aire, cañerías varias, etc. Resta completar el cercamiento del barrio para tener mayor control sobre los equipos, por lo pronto no se traerán a Manzanares.

A su vez, se planteará una obra civil en la Planta de Tratamiento. Será una readecuación de la infraestructura existente para aumentar la capacidad de la planta y permitir el correcto tratado de efluentes mediante el método de Barros Activados. Será necesario un laberinto de cloración nuevo, un sedimentador funcional y un digestor de lodos nuevo. Tanto el proyecto como la licitación de esta intervención serán abordadas en la brevedad.

RED DE AGUA POTABLE

CONCEPTO	EMPRESA/CONTRATISTA	ESTADO
Reparación de pérdidas puntuales en la red – Zona Norte	MH y SIDCO	En proceso

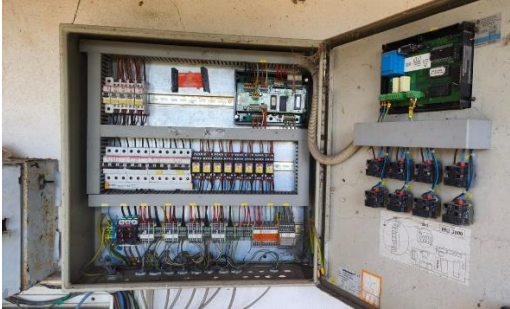
Notas:

Tras varias reparaciones de la red de agua, se han encontrado las últimas fallas y en primera instancia parecieran no haber más detecciones. Por lo pronto, la presión de la red permanece estable con la bomba sumergible instalada.

Se han reparado las pérdidas halladas de manera temporal y una vez completado el relevamiento se realizarán las reparaciones definitivas de la red. Posterior a ello, se realizará un

relevamiento para conocer lo que realmente se ha ejecutado en la red de agua ya que no coincide con la documentación existente del proyecto Lago de Manzanares.

Imágenes:

Estado del cuarto de bombeo	
	
Conexión troncal reparada	Conexión troncal reparada
	

SEGURIDAD

CONCEPTO	EMPRESA/CONTRATISTA	ESTADO
Cercado del perímetro del cerco – Zona Norte	LEGUIZAMÓN ALAMBRADOS	En proceso
Sistema de Seguridad Integral – Norte y Sur	A definir	En licitación

Notas:

Se ha enviado la licitación para el servicio de seguridad integral en el barrio a distintos contratistas y se esperan propuestas técnicas y económicas. Se buscarán opciones de videovigilancia, monitoreo y control de accesos y demás cuestiones relacionadas a la seguridad del barrio, acorde al proyecto Lago de Manzanares.

Se continúan con las tareas de cercado en el perímetro del barrio. Han cercado aproximadamente 3000 metros lineales de alambrado perimetral cercado y unos 2200 metros amurados. Resta una parte para completar toda la Etapa 1. A su vez, pronto se instalarán los portones y las puertas que se han dejado previstos para este cerco perimetral

Imágenes:

Descarga de malla electrosoldada	Frente del barrio cercado
	
Trabajos de Cercado en el perímetro del barrio	
	

A su vez, se tiene un acopio de materiales generales en las cercanías de la entrada del predio, dónde se tiene vigilancia cercana en la mayor parte del día. Aquí se irán almacenando materiales que resulten necesarios para las tareas a desarrollar.



Acopio de materiales y Emplazamiento de obradores

MANTENIMIENTO

CONCEPTO	EMPRESA/CONTRATISTA	ESTADO
Parquización– Zona Norte	MANTENIMIENTO DÍAZ	En proceso
Fumigación de pilares	Grupo R	Completado
Limpieza con retroexcavadoras – Norte y Sur	American Vial	En proceso
Limpieza Zona Sur	ND Vial	En proceso
Paisajismo	Be Garden	En proceso

Imágenes:

Imágenes del avance de mantenimiento en Zona Norte y plantación	
	



Notas:

Se continúa con trabajos de mantenimiento y desmalezamiento en toda la Zona Norte del desarrollo.

Dado que ha finalizado el desmonte de la zona sur del barrio, se realiza la limpieza de esta para intervenirla posteriormente, con un movimiento de suelos acorde. Esta tarea llevará un tiempo considerable, por lo que se pide no circular por la zona Sur del barrio dado que habrá máquinas trabajando constantemente. Se ha colocado señalización para impedir el movimiento.

Se ha culminado con la limpieza de los márgenes del arroyo y la laguna y de zonas que no permitían la colocación del cerco perimetral nuevo. Entre ellos, el frente del barrio, fondos de lote con vegetación mal colocada, etc.

Se ha culminado con la plantación de las distintas especies de árboles a lo largo de los frentes de lotes. Con ello, se instaló un riego que se alimenta de la red de agua para permitir el mantenimiento de esta plantación masiva. Son alrededor de 730 árboles para toda la etapa norte.

AGRIMENSURA / TOPOGRAFÍA

Se han marcado con estacas los límites del cerco por lo que se pide precaución al circular por el perímetro del predio. Por otro lado, los puntos fijos que se ven en el barrio están siendo utilizados como referencia por varias contratistas.

Puntos Azules: Puntos Fijos para efectuar el relevamiento topográfico.

Estacas de madera: Delimitación del cerco perimetral.

Se muestra un ejemplo:



Se avanzan con gestiones municipales y provinciales para poder contar con la documentación necesaria en todos los lotes del barrio (tanto para la Etapa Norte como para la Etapa Sur).

VIALIDADES

CONCEPTO	EMPRESA/CONTRATISTA	ESTADO
Proyecto Vial – Zona Norte	PEESA	Completado
Vialidades internas – Zona Norte	-	En licitación

Se ha enviado la licitación para realizar las vialidades internas del barrio. Será un contrato que involucre movimiento de suelos, excavación, compactación y repavimentación en las calles del barrio. Se han dado las pendientes acordes para asegurar el escurrimiento en conformidad con las normativas vigentes.

Se reemplazará el asfalto existente por uno acorde al tránsito proyectado en Lago de Manzanares, corrigiendo las cunetas en el mismo contrato. Se asegurarán radios de giro, longitudes y anchos de calzada y pendientes transversales / longitudinales que cumplan con el drenaje proyectado y con la seguridad en la circulación del barrio.

PROYECTOS

- Edificio de acceso principal
- Salón de Usos Múltiples
- Planta de Tratamiento
- House

Se están realizando las gestiones acordes para comenzar con las intervenciones civiles de las obras anteriormente mencionadas. Se avanza en conjunto con profesionales (Arquitectos, calculistas, etc.) para tener un proyecto conformado que cumpla con la estética y los requerimientos del barrio a futuro.
