
INFORME DE TRABAJOS EN LAGO DE MANZANARES

Obras en ejecución y obras previstas — Etapas Norte y Sur



Junio 2026
Barrio Privado Lago de Manzanares

ÍNDICE

OBJETIVO DEL INFORME	3
RESUMEN GENERAL	3
ETAPA NORTE	4
RED DE AGUA POTABLE	4
RED CLOACAL	5
RED ELÉCTRICA Y PILARES	5
RED DE ALUMBRADO PÚBLICO	6
SEGURIDAD Y CIERRE PERIMETRAL	6
INGRESO PRINCIPAL	7
FORESTACIÓN Y RIEGO	7
VIALIDADES Y SISTEMA PLUVIAL	8
EDIFICIOS COMUNES EXISTENTES	8
ÁREAS DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN	9
CLUB HOUSE	9
ETAPA SUR	10
CONSIDERACIONES FINALES	11

Leyenda de estados:

- Completado**— La tarea fue finalizada.
- En ejecución**— La tarea está actualmente en curso.
- En proceso**— Se están realizando gestiones o coordinaciones previas.
- Previsto**— La tarea está planificada para una etapa futura.
- Antecedente desarrollado**— Existe documentación o proyecto previo elaborado.

OBJETIVO DEL INFORME

El objetivo del presente informe es comunicar el estado de las obras actualmente en ejecución en el Barrio Lago de Manzanares, junto con las próximas intervenciones previstas para la Etapa Norte y las obras generales contempladas para el desarrollo de la Etapa Sur.

El informe busca presentar de manera ordenada las tareas vinculadas a la recuperación, normalización y puesta en valor de la infraestructura existente, diferenciando aquellas obras que ya se encuentran en ejecución de las que serán abordadas en etapas posteriores.

RESUMEN GENERAL

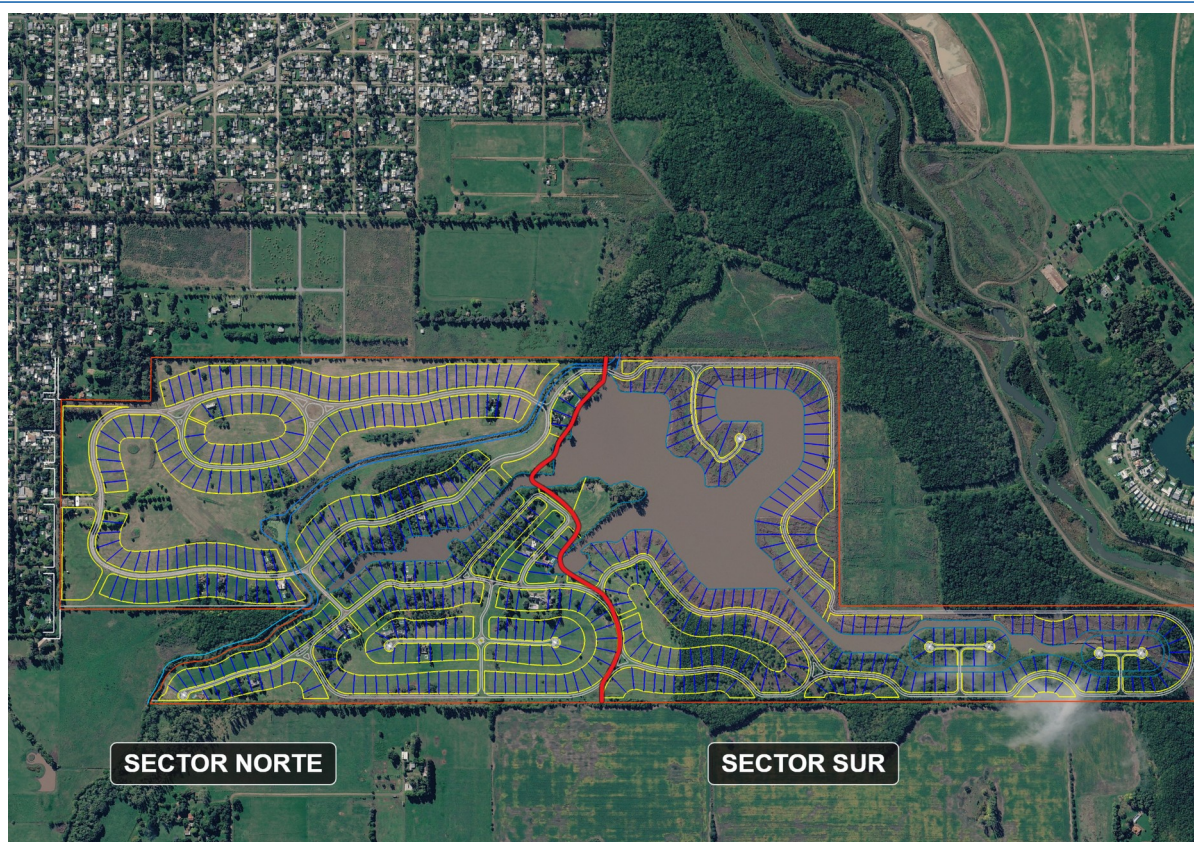


Figura 1. Vista aérea del predio — Sector Norte y Sector Sur del Barrio Lago de Manzanares.

Obras actualmente en ejecución — Etapa Norte

- Prueba, revisión y reparación de la red de agua potable existente.
- Puesta en valor de la red de alumbrado público.
- Licitación para la reparación de pilares de luz.
- Conversaciones con Edenor para la reparación de anomalías en la red eléctrica.
- Ejecución de un tramo de red cloacal que presentaba anomalías.
- Relevamiento, limpieza y desobstrucción de la red cloacal existente.
- Ejecución del cerco perimetral del sector norte.
- Reacondicionamiento del tablero eléctrico de la guardia.

- Ejecución del tendido eléctrico para los motores de los portones de ingreso.
- Plantación de árboles en el barrio, acompañada por una red de riego provisoria.

Obras previstas — Etapa Norte

- Equipamiento de la planta de tratamiento cloacal.
- Equipamiento de la estación de bombeo.
- Puesta en valor y repavimentación de las vialidades internas.
- Mejora del sistema pluvial asociado a las vialidades.
- Fabricación e instalación de nuevas vallas retardadoras de velocidad.
- Puesta en valor de edificios comunes existentes.
- Readecuación del ingreso principal del barrio.
- Recuperación del bar y vestuario existente en el macrolote ubicado a la izquierda del ingreso.
- Desarrollo de áreas deportivas y recreativas.
- Construcción de un futuro Club House sobre la laguna.

Obras previstas — Etapa Sur

- Limpieza y despeje del sector.
- Movimiento de suelos general de nivelación.
- Ampliación del brazo de la laguna.
- Ejecución de redes de agua potable, energía eléctrica y cloacas.
- Ejecución del cerco perimetral.
- Ejecución de vialidades internas y sistema pluvial.

ETAPA NORTE

RED DE AGUA POTABLE

CONCEPTO	ESTADO
Prueba de funcionamiento de la red existente	En ejecución
Detección de pérdidas y anomalías	En ejecución
Reparación de pérdidas puntuales	En ejecución

Notas:

En la Etapa Norte se están realizando pruebas sobre la red de agua potable existente, con el objetivo de verificar su estado de funcionamiento y detectar pérdidas o anomalías que deban ser reparadas.

A medida que se inyecta presión al sistema, pueden aparecer pérdidas que previamente no eran visibles. Por este motivo, las reparaciones se ejecutan de manera progresiva, conforme se identifican los puntos afectados.

Estas tareas permiten avanzar en la normalización de la red y en la recuperación del servicio para el sector norte del barrio.

RED CLOACAL

CONCEPTO	ESTADO
Relevamiento de la red cloacal existente	Completado
Limpieza y desobstrucción de la red	Completado
Ejecución de tramo con anomalías	En ejecución
Equipamiento de planta de tratamiento	Previsto
Equipamiento de estación de bombeo	Previsto

Notas:

Se realizó el relevamiento, limpieza y desobstrucción de la red cloacal existente en la Etapa Norte. A partir de estas tareas fue posible identificar sectores que presentaban anomalías y que requieren intervención específica.

Actualmente se encuentra en ejecución un tramo de red cloacal que presentaba deficiencias, con el objetivo de restituir su correcto funcionamiento.

Como intervención prevista, se contempla el equipamiento de la planta de tratamiento cloacal y de la estación de bombeo. Estas instalaciones resultan necesarias para completar la normalización del sistema cloacal del sector norte.

RED ELÉCTRICA Y PILARES

CONCEPTO	ESTADO
Conversaciones con Edenor por anomalías detectadas	En proceso
Licitación para reparación de pilares de luz	En proceso
Reacondicionamiento del tablero eléctrico de guardia	En ejecución
Tendido eléctrico para motores de portones de ingreso	En ejecución / previsto
Reparación y reconstrucción de pilares deteriorados	Previsto

Notas:

Se han mantenido conversaciones con Edenor para avanzar en la normalización de la red eléctrica del barrio y en la reparación de las anomalías detectadas. La empresa prestataria ya realizó algunas intervenciones puntuales en el sector; no obstante, aún restan tareas pendientes para completar la corrección de las situaciones relevadas. Dado que parte de las instalaciones dependen de Edenor, estas intervenciones continuarán requiriendo coordinación con dicha entidad.

En paralelo, se lanzó una licitación para la reparación de pilares existentes y la reconstrucción de aquellos que se encuentren deteriorados o rotos, incorporando un nuevo criterio estético para unificar la imagen del barrio. Esta intervención permitirá acompañar el proceso de normalización del suministro eléctrico junto con Edenor.

Queda pendiente la definición técnica respecto de la ubicación y compatibilidad de los gabinetes de gas existentes, a fin de determinar si pueden mantenerse en su disposición actual o si corresponde prever un espacio adicional para su aprobación correspondiente.

Asimismo, se encuentra en ejecución el reacondicionamiento del tablero eléctrico de la guardia. En conjunto con esta tarea, se ejecutará el tendido eléctrico necesario para alimentar los motores de los portones de ingreso, permitiendo mejorar la operación del acceso principal al barrio.

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

CONCEPTO	ESTADO
Puesta en valor del alumbrado público	En ejecución
Revisión de luminarias existentes	En ejecución
Intervenciones sobre componentes de la red	En ejecución

Notas:

Se dio inicio a la puesta en valor de la red de alumbrado público del sector norte. Las tareas contemplan la revisión de luminarias, componentes eléctricos y sectores de la red que requieren reparación o normalización.

SEGURIDAD Y CIERRE PERIMETRAL

CONCEPTO	ESTADO
Ejecución del cerco perimetral del sector norte	En ejecución
Intervención sobre acceso principal	En ejecución / previsto
Tendido para motores de portones	En ejecución / previsto
Continuidad del cerco perimetral en Etapa Sur	Previsto

Notas:

Se encuentra en ejecución el cerco perimetral correspondiente al sector norte del barrio. Esta intervención busca mejorar las condiciones de seguridad, control y resguardo del predio.

En el acceso principal, además del reacondicionamiento del tablero eléctrico de la guardia, se prevé el tendido necesario para la alimentación de los motores de los portones. Esta tarea permitirá avanzar en la normalización operativa del ingreso al barrio.

Una vez completado el cerco perimetral correspondiente al sector norte, se contempla continuar con la instalación del cierre perimetral en la Etapa Sur, sujeto al despeje y preparación previa del sector. Esta continuidad permitirá avanzar hacia el cierre integral del predio y facilitará la posterior instalación de cámaras de seguridad a lo largo del perímetro.

INGRESO PRINCIPAL

CONCEPTO	ESTADO
Readecuación del ingreso principal	Previsto
Diferenciación de accesos para propietarios y visitas	Previsto
Baños para personal	Previsto
Oficina de administración	Previsto
Sala de monitoreo de seguridad	Previsto

Notas:

Se contempla una readecuación integral del ingreso principal del barrio, con el objetivo de mejorar la circulación, el control de accesos y la operación diaria del sector.

La propuesta prevé la diferenciación de ingresos y egresos para propietarios y visitas, permitiendo ordenar el flujo vehicular y mejorar las condiciones de seguridad en el acceso.

Asimismo, se contempla la incorporación de baños para el personal, una oficina de administración y un espacio destinado al futuro funcionamiento de la intendencia del barrio.

Como parte del sistema de seguridad, se prevé también la ejecución de una sala de monitoreo de acceso restringido, destinada al control de cámaras y demás elementos asociados a la seguridad general del barrio.

FORESTACIÓN Y RIEGO

CONCEPTO	ESTADO
Plantación de árboles en el barrio	En ejecución
Red de riego provisoria	En ejecución

Notas:

Se está ejecutando una plantación de árboles en distintos sectores del barrio, acompañada por una red de riego provisoria.

Esta intervención forma parte de la puesta en valor general del predio y busca acompañar la recuperación de los espacios comunes mediante una mejora paisajística progresiva.

VIALIDADES Y SISTEMA PLUVIAL

CONCEPTO	ESTADO
Proyecto y evaluación de vialidades internas	Antecedente desarrollado
Puesta en valor de calles existentes	Previsto
Repavimentación de vialidades internas	Previsto
Mejora del sistema pluvial asociado a las vialidades	Previsto
Fabricación de nuevas vallas retardadoras de velocidad	Previsto

Notas:

Se prevé la puesta en valor y repavimentación de las vialidades internas de la Etapa Norte. Esta intervención contempla la recuperación de las calles existentes, la adecuación de niveles y la mejora de las condiciones de circulación.

En conjunto con las tareas sobre las vialidades, se contempla la mejora del sistema pluvial del sector, con el objetivo de optimizar el escurrimiento superficial, mejorar el funcionamiento de cunetas y desagües existentes, y acompañar la recuperación general de las calles internas.

Asimismo, se prevé la fabricación de nuevas vallas retardadoras de velocidad, destinadas a ordenar la circulación interna y reforzar las condiciones de seguridad vial dentro del barrio.

Estas intervenciones serán desarrolladas de manera coordinada, considerando tanto la transitabilidad como el correcto funcionamiento hidráulico de las calles.

EDIFICIOS COMUNES EXISTENTES

CONCEPTO	ESTADO
Puesta en valor de edificios comunes existentes	Previsto
Recuperación de bar existente	Previsto
Recuperación de vestuario existente	Previsto
Cancha provisoria de fútbol 9	Previsto

Notas:

Se contempla la puesta en valor de los edificios comunes existentes dentro de la Etapa Norte.

Estas tareas estarán orientadas a recuperar, adecuar y mejorar las condiciones funcionales, constructivas y de servicio de los espacios comunes del barrio, acompañando el proceso general de recuperación de la infraestructura existente.

En el macrolote ubicado a la izquierda del ingreso se prevé la recuperación del bar y del vestuario existente, con el objetivo de poner en valor construcciones actualmente disponibles y destinarlas a usos comunes del barrio.

De manera provisoria, se contempla además la conformación de una cancha de fútbol 9, como parte de las intervenciones recreativas previstas para el sector.

ÁREAS DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN

CONCEPTO	ESTADO
Sendero ecológico	Previsto
Estaciones de gimnasia	Previsto
Juegos para chicos	Previsto
Espacios de esparcimiento parqueizados	Previsto
Dos canchas de tenis	Previsto
Dos canchas de pádel	Previsto

Notas:

En el sector originalmente previsto para el desarrollo de 9 hoyos de golf, se contempla una nueva propuesta de uso común orientada a actividades recreativas, deportivas y de esparcimiento.

La intervención prevé la ejecución de un sendero ecológico con estaciones predeterminadas para gimnasia, juegos para chicos y espacios de permanencia parqueizados.

En materia deportiva, se contempla la construcción de dos canchas de tenis y dos canchas de pádel, integradas al esquema general de espacios comunes del barrio.

CLUB HOUSE

CONCEPTO	ESTADO
Construcción de Club House sobre la laguna	Previsto

Notas:

Se prevé la construcción de un Club House de aproximadamente 400 m², ubicado sobre la laguna y separado por una calle del sector destinado a canchas de tenis y pádel.

Esta intervención formará parte de la puesta en valor de los espacios comunes del barrio y estará orientada a generar un punto de encuentro y uso social vinculado al entorno paisajístico de la laguna.

ETAPA SUR

OBRAS PREVISTAS PARA EL SECTOR SUR

CONCEPTO	ESTADO
Limpieza y despeje del sector	Previsto
Movimiento de suelos general de nivelación	Previsto
Ampliación del brazo de la laguna	Previsto
Ejecución de red de agua potable	Previsto
Ejecución de red eléctrica	Previsto
Ejecución de red cloacal	Previsto
Ejecución de cerco perimetral	Previsto
Ejecución de vialidades internas	Previsto

Notas:

La Etapa Sur requiere una intervención integral orientada a ordenar y normalizar la situación actual del sector. Para ello, resulta necesario avanzar con la limpieza y despeje de las áreas invadidas por monte y acacias negras, permitiendo luego ejecutar los trabajos de nivelación, apertura de caminos y tendido de redes de servicios.

Dentro de las tareas previstas se encuentra la ejecución de un movimiento de suelos general de nivelación, necesario para alcanzar las condiciones topográficas adecuadas para el futuro desarrollo del sector.

Asimismo, se prevé la ampliación del brazo de la laguna, como parte de la configuración general del área sur y de su integración con el entorno paisajístico del barrio.

En materia de servicios, se contempla la ejecución de las redes de agua potable, energía eléctrica y cloacas, necesarias para dotar al sector de la infraestructura básica correspondiente.

También se prevé la ejecución del cerco perimetral de la Etapa Sur, dando continuidad al criterio de cierre y seguridad implementado en el sector norte.

Finalmente, se contempla la ejecución de las vialidades internas, incluyendo las tareas necesarias para la conformación de calles, niveles y condiciones de circulación acordes al desarrollo previsto.

CONSIDERACIONES FINALES

Las obras descritas forman parte de un proceso progresivo de recuperación, normalización y desarrollo del Barrio Lago de Manzanares.

En la Etapa Norte, las tareas actualmente en ejecución se concentran en la puesta en funcionamiento y mejora de la infraestructura existente, incluyendo redes de agua, cloacas, electricidad, alumbrado, seguridad, acceso, forestación, riego y servicios comunes.

En paralelo, se encuentran previstas intervenciones de mayor alcance, como la equipación de la planta de tratamiento y estación de bombeo, la repavimentación y puesta en valor de vialidades, la mejora del sistema pluvial, la fabricación de nuevas vallas retardadoras de velocidad, la puesta en valor de edificios comunes existentes, la readecuación del ingreso principal, el desarrollo de áreas deportivas y recreativas, y la construcción de un futuro Club House.

Para la Etapa Sur, se contempla un desarrollo integral que incluirá limpieza y despeje del sector, movimiento de suelos, ampliación de laguna, ejecución de servicios, cerco perimetral y vialidades internas.

El avance de las distintas tareas será abordado de manera progresiva, conforme a las condiciones técnicas, operativas y de coordinación necesarias para cada intervención.
