

INFORME DE TRABAJOS EN LAGO DE MANZANARES



INDICE

OBJETIVO DEL INFORME	3
RESUMEN DEL MES DE MARZO.....	3
RED ELÉCTRICA	4
RED CLOACAL	5
RED DE AGUA POTABLE.....	6
SEGURIDAD	8
MANTENIMIENTO	9

OBJETIVO DEL INFORME

El objetivo del presente informe es presentar un resumen mensual que contemple las tareas desarrolladas en el Barrio Lago de Manzanares, con los participantes involucrados en cada tarea ejecutada y una actualización de lo que ha sucedido durante el mes en cuestión.

RESUMEN DEL MES DE MARZO

Principales avances:

- Se inició con la puesta en valor del servicio eléctrico.
- Se reemplazó la bomba sumergible de agua y se realizaron pruebas en la red.
- Se relevaron y comenzaron a reparar las redes cloacales.
- Se avanzó en trabajos de seguridad (portones, cámaras).
- Se continúa con las tareas de mantenimiento y limpieza general.

Temas a considerar:

- La planta de tratamiento cloacal y estación de bombeo todavía no está operativa.
- La red de agua presenta pérdidas que deben repararse.
- Tanto la red eléctrica como el alumbrado público presentan fallas.

RED ELÉCTRICA

CONCEPTO	EMPRESA/CONTRATISTA	ESTADO
Relevamiento del tendido eléctrico existente en la Zona Norte del barrio	TECNAO	Completado
Reparaciones de la red y rehacer las partes saqueadas – Zona Norte	A definir	En licitación
Mejora del suministro de energía eléctrica	Edenor	En proceso

Imágenes:

Estado actual de la red eléctrica	
	
	



Notas:

Se han mantenido reuniones con la distribuidora, en las que se expuso el estado de la red y de las instalaciones. Se trabajará en conjunto mediante reclamos puntuales durante un período transitorio. Las reparaciones están sujetas al informe del relevamiento eléctrico por parte de la contratista, tanto el alumbrado como pilares en general. Posteriormente comenzarán las reparaciones.

RED CLOACAL

CONCEPTO	EMPRESA/CONTRATISTA	ESTADO
Relevamiento de las bocas de inspección y prueba hidráulica de la red – Zona Norte	BROCA	Completado
Reparaciones de la red en mal estado – Zona Norte	BROCA	En proceso
Reequipamiento de la planta de tratamiento y estaciones elevadoras	A definir	Pendiente de suministro eléctrico y cierre del perímetro

Imágenes:

Boca de registro tipo del barrio	
	
Planta de Tratamiento en la actualidad	
	

Notas:

Se finalizó el relevamiento inicial de la red. A partir de ahora se ejecutarán tareas de limpieza, desobstrucción y acondicionamiento de toda la red existente. Tanto la planta de tratamiento como la estación de bombeo permanecerán sin equipar, hasta tanto se logre un suministro confiable de la red eléctrica y se asegure el perímetro del barrio.

RED DE AGUA POTABLE

CONCEPTO	EMPRESA/CONTRATISTA	ESTADO
Reemplazo de bomba sumergible con tablero de control	MH	Completado

Relevamiento de la Red de agua – Zona Norte	MH	En proceso
Relevamiento del equipo de bombeo existente	GRUNDFOS	Completado

Notas:

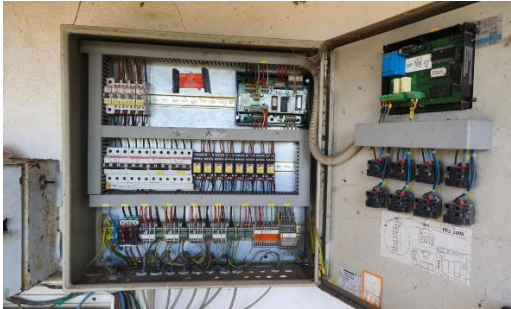
Se reemplazó la bomba sumergible averiada por la que habían adquirido los vecinos. Se equipó la bomba con un tablero de control y un presurizador para poder probar la red.

Se comenzaron a realizar pruebas detectando fugas y artefactos defectuosos. Una vez que se termine el relevamiento, se comenzará con las tareas de reparación.

El equipo de bombeo existente (4 bombas CRE en serie) ha sido relevado por GRUNDFOS y se encuentra pendiente la cotización.

El sistema de bombeo definitivo aún está en evaluación y no será puesto en funcionamiento hasta asegurar condiciones adecuadas de seguridad.

Imágenes:

Estado del cuarto de bombeo	
	
Bomba sumergible retirada	Hidrante averiado de la red
	

Tablero nuevo de la bomba sumergible



SEGURIDAD

CONCEPTO	EMPRESA/CONTRATISTA	ESTADO
Automatización de portones de entrada – Zona Norte	KARTOS	En proceso
Cierre del perímetro con cercado	A definir	En licitación
Seguridad del cuarto de bombeo	KARTOS	En proceso
Cámaras y domo	-	Completado

Imágenes:

Motores del portón existentes en el barrio



Acceso al cuarto de bombeo actual



Notas:

Se ha contratado la automatización de los portones de entrada para gestionar con una aplicación la apertura de los mismos. Para esta tarea se utilizará uno de los motores ya disponibles en el barrio y se adquirieron dos nuevos. En cuanto al cuarto de bombeo, se solicitó cotización para su readecuación y evitar intrusiones para cualquier equipo que se coloque.

Se encuentra en licitación el cercado de todo el perímetro del barrio. En una etapa posterior se equipará ese cerco con luminaria y un sistema de cámaras.

MANTENIMIENTO

CONCEPTO	EMPRESA/CONTRATISTA	ESTADO
Parquización– Zona Norte	MANTENIMIENTO DÍAZ	En proceso
Colocación de carteles “prohibido bañarse”	MANTENIMIENTO DÍAZ	En proceso

Imágenes:



*Notas:*

Está pendiente la contratación de la fumigación del predio para eliminar malezas y favorecer la recuperación del césped. En paralelo se realizan tareas con una mini pala y camión para coleccionar la suciedad generada debido a los trabajos de desmalezamiento.

En cuanto a los carteles de “Prohibido bañarse”, prontamente serán visibles en los alrededores de la laguna y demás cuerpos de agua del barrio.
