

INFORME DE TRABAJOS EN LAGO DE MANZANARES



INDICE

OBJETIVO DEL INFORME	3
RESUMEN DEL MES DE ABRIL.....	3
RED ELÉCTRICA	4
RED CLOACAL	5
RED DE AGUA POTABLE.....	7
SEGURIDAD	8
MANTENIMIENTO	10
AGRIMENSURA / TOPOGRAFÍA	11

OBJETIVO DEL INFORME

El objetivo del presente informe es presentar un resumen mensual del mes de Abril que contemple las tareas desarrolladas en el Barrio Lago de Manzanares, con los participantes involucrados en cada tarea ejecutada y una actualización de lo que ha sucedido durante el mes en cuestión.

RESUMEN DEL MES DE ABRIL

Principales avances:

- Colocación de motores para el portón de la entrada.
- Extracción de muestras de suelo para definir el relleno de las calles a transitar.
- Se continúa con las tareas de mantenimiento y limpieza general del predio
- Se inició con la colocación de un nuevo cerco perimetral.
- Se avanzó con el desmonte de la zona Sur del barrio.
- Se continúan reparando las redes cloacales y se vació la planta de tratamiento y estaciones elevadoras.
- Se licitó la reparación de la red eléctrica junto con la red de alumbrado.
- Se fumigó todo el barrio Lago de Manzanares.
- Se realizaron pruebas en la red de agua potable, y se han cotizado reparaciones menores.
- Se avanzó con trabajos de agrimensura en el barrio.

Temas a considerar:

- La planta de tratamiento cloacal y estación de bombeo todavía no está operativa.
- Hay un tramo de red cloacal que necesita ser reparado, por lo que se avanzará con esa obra en el corto plazo.
- La red de agua presenta pérdidas que deben repararse.
- Tanto la red eléctrica como el alumbrado público presentan fallas.
- Las constantes lluvias durante el mes de abril han dificultado el avance de las tareas

RED ELÉCTRICA

CONCEPTO	EMPRESA/CONTRATISTA	ESTADO
Relevamiento del tendido eléctrico existente - Zona Norte	TECNAO	Completado
Reparaciones de la red y rehacer las partes saqueadas – Zona Norte	A definir	En licitación
Reparaciones de la red de alumbrado y provisión de farolas – Zona Norte	A definir	En licitación
Mejora del suministro de energía eléctrica	Edenor	En proceso

Imágenes:

Estado actual de la red eléctrica	
Intervención de Edenor	Pilar deshabilitado por Edenor
	

Notas:

Tanto Edenor como de Rowing, su contratista, efectuaron visitas para relevar el estado actual de la red eléctrica del barrio y realizaron intervenciones en pilares. Sigue el trabajo en conjunto para traer la mejor solución al estado de la red.

Ya con la red relevado, se ha licitado la reparación de la misma para confeccionar un contrato posteriormente, tanto las luminarias defectuosas como el servicio de electricidad interno.

RED CLOACAL

CONCEPTO	EMPRESA/CONTRATISTA	ESTADO
Relevamiento de las bocas de inspección y prueba hidráulica de la red – Zona Norte	BROCA	Completado
Reparaciones de Bocas de Registro – Zona Norte	BROCA	En proceso
Vaciado de la planta de tratamiento de efluentes y estaciones elevadoras	BROCA	Completado
Reparación de tramo de Red de Cloacas – Zona Norte	A definir	En licitación
Reacondicionamiento Planta de Tratamiento y Estaciones Elevadoras	A definir	En proyecto

Imágenes:

Estado Actual de la Red (Bocas de Registro)	
	

	
Vaciado de Planta de Tratamiento y Estaciones Elevadoras	
	
	

Notas:

Se finalizó el relevamiento inicial de la red, descubriendo todas las bocas de registro enterradas por debajo de la calle. Se han ejecutado tareas de desobstrucción durante todo el mes. En el diagnóstico hay alrededor de 800m de cañería que deberán ser tendidos nuevamente en la proximidad, dado que no tienen la profundidad suficiente. También se ejecutaron readecuaciones de bocas de registro que presentaban tapas por debajo del nivel del terreno.

Se considera que la planta de tratamiento y la estación elevadora cuentan con una infraestructura civil óptima, que se readecuará a las condiciones actuales. Ya se están considerando opciones para un correcto funcionamiento del tratamiento de efluentes en la zona existente del barrio. La planta se equipará completamente cuando las condiciones de electricidad y seguridad sean adecuadas para los equipos.

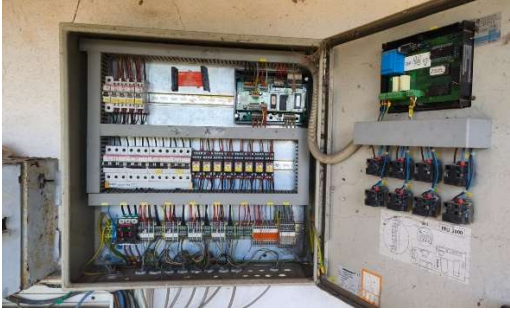
RED DE AGUA POTABLE

CONCEPTO	EMPRESA/CONTRATISTA	ESTADO
Reparación de pérdidas puntuales en la red – Zona Norte	MH	En proceso

Notas:

Tras algunas pruebas de la red, se repararán las pérdidas puntuales más notorias para poder elevar la presión del sistema. Es probable que con el aumento de presión aparezcan más pérdidas, se irán reparando a medida que sean visibles. Queda pendiente la reparación de hidrantes para bomberos, los cuales se remplazaran en el mes de mayo.

Imágenes:

Estado del cuarto de bombeo	
	
Bomba sumergible retirada	Hidrante averiado de la red



Tablero nuevo de la bomba sumergible	Hidrante tipo de la red, averiado
	

SEGURIDAD

CONCEPTO	EMPRESA/CONTRATISTA	ESTADO
Automatización de portones de entrada – Zona Norte	KARTOS	Completado
Cercado del perímetro del cerco	LEGUIZAMÓN ALAMBRADOS	En proceso
Ampliación y puesta en valor de las rejas de entrada.	A definir	En licitación
Readecuación de seguridad en el cuarto de bombeo	A definir	En licitación
Instalación carteles “Prohibido Bañarse”	DÍAZ MANTENIMIENTO	Completado

Notas:

Se han instalado los motores para la apertura automática de los portones de entrada. Resta normalizar el suministro eléctrico en la entrada para habilitar su uso.

Han comenzado las tareas de cercado en el perímetro del barrio. Se trata de un cerco con malla electrosoldada de 2mts con 2 líneas de púas. Estos irán colocados con murete de hormigón para evitar el hurto. La contratista avanza en zonas liberadas y a la par se despejan zonas futuras.

Se han instalado carteles de “Prohibido Bañarse” en zonas cercanas a la Laguna.

Imágenes:

Motores instalados en la entrada	Acceso al cuarto de bombeo actual
	
Carteles de “Prohibido bañarse”	Estado Actual de los portones de entrada
	

Trabajos de Cercado en el perímetro del barrio


MANTENIMIENTO

CONCEPTO	EMPRESA/CONTRATISTA	ESTADO
Parquización– Zona Norte	MANTENIMIENTO DÍAZ	En proceso
Fumigación	PyP	Completado

Imágenes:

Imágenes del avance de mantenimiento




Notas:

Se ha completado la fumigación del predio contra las malezas y hojas anchas. En paralelo se realizan tareas con una mini pala y camión para coleccionar la suciedad generada debido a los trabajos de desmalezamiento.

Se adquirió una máquina Giro Cero para complementar a las demás máquinas de jardinería y facilitar las tareas de mantenimiento.

AGRIMENSURA / TOPOGRAFÍA

Se han avanzado con demarcación de puntos fijos a lo largo de todo el barrio que luego serán útiles para trabajos de topografía. Desde dirección de obra pedimos mantener la integridad de esos puntos fijos ya que luego resultaría complejo materializar medidas sin ellos.

Puntos Naranjas: Delimitación del cerco.

Puntos Azules: Puntos Fijos para efectuar el relevamiento topográfico.

Se muestra un ejemplo:

