ZANARA

DESARROLLO Y GERENCIAMIENTO DE CONSTRUCCIÓN

INFORME DE TRABAJOS EN LAGO DE MANZANARES



LAGO DE MANZANARES

BLANCO ENCALADA 197 - OFIC. 41 www.zanara.com.ar

INDICE

OBJETIVO DEL INFORME 3
RESUMEN DEL MES DE AGOSTO 3
RED ELÉCTRICA 4
RED CLOACAL 6
RED DE AGUA POTABLE 7
SEGURIDAD 8
MANTENIMIENTO 10
AGRIMENSURA / TOPOGRAFÍA 11
VIALIDADES 12
AMENITIES 13
PROYECTOS 15

OBJETIVO DEL INFORME

El objetivo del presente informe es presentar un resumen mensual del mes de Octubre que contemple las tareas desarrolladas en el Barrio Lago de Manzanares, con los participantes involucrados en cada tarea ejecutada y una actualización de lo que ha sucedido durante el mes en cuestión.

RESUMEN DEL MES DE AGOSTO

Principales avances:

- Se continúa avanzando con el recupero de la Red de Alumbrado Público
- Se continúa con las tareas de mantenimiento y limpieza general del predio
- Se continúa con la plantación de árboles en el Sector Norte del barrio.
- Se continúa con la reparación de pilares domiciliarios de la Etapa Norte
- Se continúa con la reparación de tramos de Red Cloacal inoperativos.
- Se continúa con la construcción del área deportiva del barrio
- Se continúa con la construcción del SUM del barrio
- Se continúa con las Vialidades Internas en la Zona Norte.
- Se ha equipado la estación de bombeo chica de la Zona Norte.

Temas a considerar:

- Se ha colocado una bomba provisoria en la estación chica para bombear el efluente y pronto se equipará el resto del sistema, pendiente de obras de ampliación.
- Se continúa con la puesta en valor de la red de vialidad interna del barrio. Se ha intervenido el sector previo al puente por ahora, pronto será asfaltado.
- Edenor y Rowing han avanzado con mejoras en el servicio tras reclamos del barrio y de la Dirección de Obra. Hay diálogo con la distribuidora para coordinar las tareas en el servicio.
- Se ha concluido con el cercado de la Etapa Norte, pronto se continuará con la Etapa Sur.
- Han comenzado a colocar el revestimiento en los más de 200 pilares domiciliarios.
- Se ha zanjeado y reacondicionado todas las luminarias del sector previo al puente en el barrio. Se continúa con la corrección de bases y luminarias en el sector pasando el puente.

RED ELÉCTRICA

CONCEPTO	EMPRESA/CONTRATISTA	ESTADO
Reparación de pilares existentes	C&G	En proceso
Reparaciones de la red de alumbrado	TECNAO	En proceso
Reparación del suministro de energía eléctrica	Edenor	En proceso

Imágenes:

<table>
<tr><td colspan="2">RED ELÉCTRICA Y RED DE ALUMBRADO</td></tr>
<tr><td>Calle alumbrada</td><td>Farola Nueva Montada</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>Pilar revocado por C&G</td><td>Farolas viejas desarmadas</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
</table>

Zanjeo para Red de Iluminación	Zanjeo realizado por TECNAO
	

Notas:

Durante octubre la distribuidora de energía ha corregido fallas aisladas del sistema, pero aún no ha propuesto un plan de puesta en valor de la red eléctrica. Hay un diálogo constante con la distribuidora, pero aún no han traído una solución al problema de baja tensión en Lago de Manzanares.

Por otra parte, C&G continúa las tareas de puesta en valor de los pilares de iluminación del barrio. Han materializado los pilares demolidos o faltantes de construir y han comenzado recientemente con la colocación del revestimiento exterior.

A su vez, se continúan las tareas de reparación de la red de alumbrado en el barrio por parte de TECNAO. Han concluido con la intervención en toda la zona central del barrio, tanto zanjeo como colocación de farolas de iluminación. La línea de alumbrado en el barrio se encontraba con serios problemas en la ejecución, por lo que hubo un trabajo de sectorización previo al zanjeo actual. Se continúa con la puesta en valor en el lado izquierdo, donde se esperan trabajos de zanjeo en la zona perimetral y trabajos de corrección de fases en el resto del barrio.

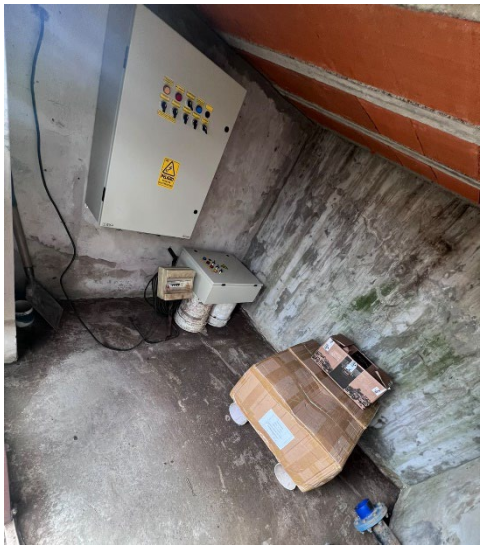
Desde dirección de obra les pedimos que se le permita trabajar a ambas contratistas (C&G y TECNAO) durante el día. En caso de necesitar intervención en farolas alimentadas por las casas o en los pilares con medidores activos, se le notificará debidamente a los vecinos.

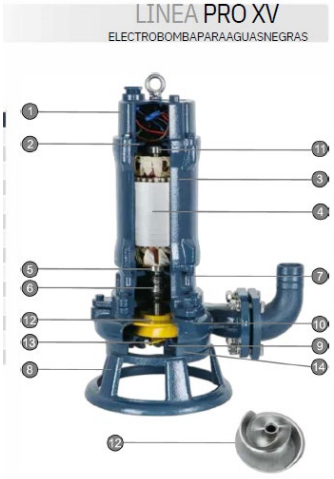
Se van detectando fallas nuevas a la par de que se trabaja, por lo que puede haber cambios en los sectores iluminados a medida que se repara.

RED CLOACAL

CONCEPTO	EMPRESA/CONTRATISTA	ESTADO
Normalización de la red cloacal y red de agua	SIDCO	En proceso
Equipamiento de Plante de Tratamiento y Estación Elevadora	INGENAT	En proceso
Obra Civil en la PTE	A definir	En licitación

Imágenes:

<table>
<tr><td>Tablero Ppal instalado en la Planta de Tratamiento</td><td>Cañerías instaladas en el tramo cercano a la Rotonda</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td colspan="2">Zanjeo y tendido de tramo cloacal</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
</table>

“Cojinete” ejecutado	Folleto de bombas empleadas en la PTE
	

Notas:

Se ha concluido con las tareas de reparación del tramo cloacal en la zona cercana a la rotonda. Se reemplazo el tendido mal ejecutado y se han instalado tramos nuevos con una compactación acorde. Además, SIDCO ha realizado reparaciones aisladas en otros sectores del barrio.

Se ha comenzado con la desobstrucción del tramo de la red que conecta a la planta de tratamiento. Previo a finalizar el contrato con SIDCO se realizará una prueba hidráulica de la red cloacal para verificar la correcta ejecución.

Ya se cuentan con los equipos necesarios para poder utilizar la Planta de Tratamiento y ambas Estaciones Elevadoras. INGENAT se ocupa de la refuncionalización de ambas fosas de bombeo y del equipamiento de la planta de tratamiento.

Se han recibido ofertas para la obra civil a realizar en la planta de tratamiento, que permitirá aumentar la capacidad de efluentes a tratar. Se tratan de 5 estructuras nuevas que permitirán un correcto funcionamiento del sistema de barros activados y un correcto vuelco en un punto habilitado.

RED DE AGUA POTABLE

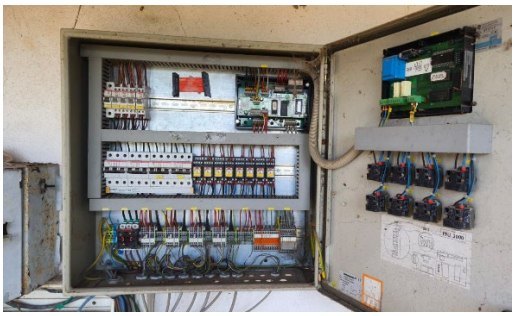
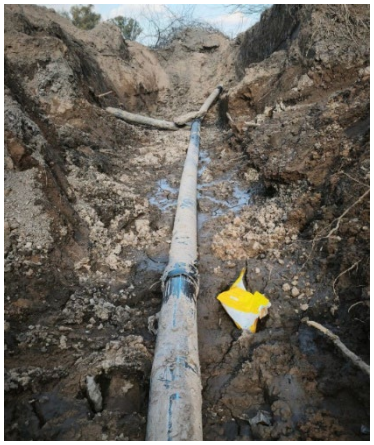
CONCEPTO	EMPRESA/CONTRATISTA	ESTADO
Reparación de pérdidas puntuales en la red – Zona Norte	MH y SIDCO	En proceso

Notas:

Tras varias reparaciones de la red de agua, se han encontrado las últimas fallas y en primera instancia parecieran no haber más detecciones. Por lo pronto, la presión de la red permanece estable con la bomba sumergible instalada.

Se ha realizado un relevamiento de la red y se han encontrado discrepancias con los planos existentes del barrio. Por ello, se realizará un relevamiento en detalle de la red existente para corregir la documentación. Como foco, se realizan cateos en la red existente para encontrar los elementos de corte (válvulas) que no están visibles en planos del barrio.

Imágenes:

<table>
<tr><td colspan="2">Estado anterior del cuarto de bombeo</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>Conexión troncal reparada</td><td>Conexión troncal reparada</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
</table>

SEGURIDAD

CONCEPTO	EMPRESA/CONTRATISTA	ESTADO
Cercado del perímetro – Etapa Norte	LEGUIZAMÓN ALAMBRADOS	Completado
Cercado del perímetro – Etapa Sur	A definir	En licitación
Sistema de Seguridad Integral	A definir	En licitación

Notas:

Se ha enviado la licitación para el servicio de seguridad integral en el barrio a distintos contratistas y se esperan propuestas técnicas y económicas. Se buscarán opciones de videovigilancia, monitoreo y control de accesos y demás cuestiones relacionadas a la seguridad del barrio, acorde al proyecto Lago de Manzanares.

Se ha concluido con el cercado del sector Norte del barrio, con la salvedad de completar los cruces del arroyo las Flores en instancias futuras. En la brevedad se continuará con el sector Sur, de unos 3800mts de longitud.

Imágenes:

Portón de acceso instalado	Frente del barrio cercado
	

Trabajos de Cercado en el perímetro del barrio	
	

A su vez, se tiene un acopio de materiales generales en las cercanías de la entrada del predio, dónde se tiene vigilancia cercana en la mayor parte del día, y otro en las cercanía de una rotonda. Aquí se irán almacenando materiales que resulten necesarios para las tareas a desarrollar.





Acopio de materiales y Emplazamiento de obradores

MANTENIMIENTO

CONCEPTO	EMPRESA/CONTRATISTA	ESTADO
Parquización	MANTENIMIENTO DÍAZ	En proceso
Limpieza Zona Sur	ND Vial	Completado
Paisajismo	Be Garden	En proceso

Imágenes:

Imágenes del avance de mantenimiento en Zona Norte y plantación	
	

Notas:

Se continúa con trabajos de mantenimiento y desmalezamiento en toda la Zona Norte del desarrollo.

Se han realizado limpiezas en la cercanía del arroyo Las Flores de manera momentánea, para mejorar la circulación. Tras un relevamiento efectuado del arroyo, se han detectado desniveles importantes en el fondo que perjudican la circulación aguas abajo. Se deberán realizar mejoras en este arroyo para favorecer el desagüe.

Se han concluido momentáneamente con los trabajos en el Sector Sur del barrio, una vez concluida la limpieza del sector. En la brevedad se contratará el movimiento de suelos en el sector sur, que se dedicará a las tareas de relleno en los lotes irregulares y de la excavación en algunos sectores. Esta tarea llevará un tiempo considerable, por lo que se pide no circular por la zona Sur del barrio dado que habrá máquinas trabajando constantemente. Se ha colocado señalización para impedir el movimiento.

Se continúa con la ejecución del proyecto paisajístico tras concretar la plantación de más de 700 árboles en los frentes de lote. Además, se han realizado plantaciones de árboles en diversos sectores verdes de la Etapa Norte.

AGRIMENSURA / TOPOGRAFÍA

Se han marcado con estacas los límites del cerco por lo que se pide precaución al circular por el perímetro del predio. Por otro lado, los puntos fijos que se ven en el barrio están siendo utilizados como referencia por varias contratistas.

Puntos Azules: Puntos Fijos para efectuar el relevamiento topográfico.

Estacas de madera: Delimitación del cerco perimetral.

Se muestra un ejemplo:



Se avanzan con gestiones municipales y provinciales para poder contar con la documentación necesaria en todos los lotes del barrio (tanto para la Etapa Norte como para la Etapa Sur).

VIALIDADES

CONCEPTO	EMPRESA/CONTRATISTA	ESTADO
Proyecto Vial – Zona Norte	PEESA	Completado
Proyecto Vial – Zona Sur	PEESA	En proceso
Vialidades internas – Zona Norte	ZAMVIAL	En proceso

Se continúa la obra de vialidades internas de la Etapa Norte del barrio. ZAMVIAL ha realizado un mejoramiento de la subrasante en las calles previas al puente y se ha completado con el paquete estructural planteado por PEESA. En la brevedad se comenzará con el asfaltado de los sectores que ya cuentan con la terminación final.

Además, se ha comenzado con la excavación y el replanteo de las calles que no se encontraban ejecutadas en la Zona Norte.

A la par, se van reemplazando caños pluviales deteriorados y realizando una compactación luego de esta instalación.

Dado que se trata de una obra de gran envergadura, se realizarán las comunicaciones acordes para notificar los sectores por los que se irá avanzando. Desde la Dirección de Obra enviaremos una secuencia de calles a intervenir para notificar a los vecinos la circulación recomendada de manera temporal.

Colocación de suelo cemento	Excavación de calle en perímetro izquierdo









AMENITIES

CONCEPTO	EMPRESA/CONTRATISTA	ESTADO
Canchas de tenis y pádel	Marino Tenis	En proceso
Cancha de fútbol	ZAMVIAL	Completada
SUM	Construcciones Báez	En proceso

Notas:

Se continúa con la obra del SUM, que modernizará el antiguo House del barrio para generar un lugar de reuniones a futuro. En este sentido, se comparten algunas imágenes del avance:






La obra se encuentra en instancias finales, prevista de finalización el presente mes.

En sintonía con esto, se continúa con la construcción de 2 canchas de pádel con césped sintético y 2 canchas de tenis del tipo rápidas. Dadas las recientes lluvias no se realizó el avance esperado pero se continúa con el movimiento de suelos en las 4 canchas para luego empezar con la colocación del paquete final




Movimiento de Suelos en las canchas de Tenis y Pádel

PROYECTOS

- Edificio de acceso principal
- Planta de Tratamiento
- House
- Puentes

Se están realizando las gestiones acordes para comenzar con las intervenciones civiles de las obras anteriormente mencionadas. Se avanza en conjunto con profesionales (Arquitectos, calculistas, etc.) para tener un proyecto conformado que cumpla con la estética y los requerimientos del barrio a futuro.

La Planta de Tratamiento de Efluentes comenzará su obra en la brevedad. Secuencialmente lo harán el edificio de acceso principal y el House proyectados, pendientes de aprobaciones municipales para su realización.

Se está efectuando la licitación que comprenderá los trabajos a realizar en los puentes peatonales y vehiculares. Comprenderá tareas de reparación superficial, y estructural en los casos que lo requiera.



Edificio de entrada en la actualidad





Puentes peatonales y vehiculares en la actualidad
