ZANARA

DESARROLLO Y GERENCIAMIENTO DE CONSTRUCCIÓN

INFORME DE TRABAJOS EN LAGO DE MANZANARES



LAGO DE MANZANARES

BLANCO ENCALADA 197 - OFIC. 41 www.zanara.com.ar

INDICE

OBJETIVO DEL INFORME 3
RESUMEN DEL MES DE SEPTIEMBRE 3
RED ELÉCTRICA 4
RED CLOACAL 6
RED DE AGUA POTABLE 8
SEGURIDAD 9
MANTENIMIENTO 10
AGRIMENSURA / TOPOGRAFÍA 12
VIALIDADES 12
AMENITIES 14
PROYECTOS 15

OBJETIVO DEL INFORME

El objetivo del presente informe es presentar un resumen mensual del mes de Septiembre que contemple las tareas desarrolladas en el Barrio Lago de Manzanares, con los participantes involucrados en cada tarea ejecutada y una actualización de lo que ha sucedido durante el mes en cuestión.

RESUMEN DEL MES DE SEPTIEMBRE

Principales avances:

- Se continúa avanzando con el recupero de la Red de Alumbrado Público
- Se continúa con las tareas de mantenimiento y limpieza general del predio
- Se continúa con la plantación de árboles en el Sector Norte del barrio.
- Se continúa con la reparación de pilares domiciliarios de la Etapa Norte
- Se continúa con la reparación de tramos de Red Cloacal inoperativos.
- Se continúa con la construcción del área deportiva del barrio
- Se continúa con la construcción del SUM del barrio
- Se ha comenzado con las Vialidades Internas en la Zona Norte.
- Se ha equipado la estación de bombeo chica de la Zona Norte.

Temas a considerar:

- Se ha colocado una bomba provisoria en la estación chica para bombear el efluente y pronto se equipará el resto del sistema, pendiente de obras de ampliación.
- Ha comenzado la puesta en valor de la red de vialidad interna del barrio. Se ha comenzado con el sector que se encontraba intervenido, cercano a la rotonda.
- Edenor y Rowing han avanzado con mejoras en el servicio tras reclamos del barrio y de la Dirección de Obra. Hay diálogo con la distribuidora para coordinar las tareas en el servicio.
- Restan pocos metros para concluir con el cercado de la Etapa Norte. Luego se continuará con la Zona Sur para poder terminar el cercado.
- Se está pronto a concluir con tareas de reparación de pilares domiciliarios, quedando pendiente el revestimiento.
- Se ha comenzado con el zanjeo de cable subterráneo para reponer tramos sin funcionar. Ya se han colocado todas las farolas en el lado izquierdo del barrio.

RED ELÉCTRICA

CONCEPTO	EMPRESA/CONTRATISTA	ESTADO
Reparación de pilares existentes	C&G	En proceso
Reparaciones de la red de alumbrado	TECNAO	En proceso
Reparación del suministro de energía eléctrica	Edenor	En proceso

Imágenes:

<table>
<tr><td colspan="2">RED ELÉCTRICA Y RED DE ALUMBRADO</td></tr>
<tr><td>Calle alumbrada</td><td>Farola Nueva Montada</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>Pilar revocado por C&G</td><td>Farolas viejas desarmadas</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
</table>

Zanjeo para Red de Iluminación	Zanjeo realizado por TECNAO
	

Notas:

Durante septiembre la distribuidora de energía ha corregido fallas aisladas del sistema, pero aún no ha propuesto un plan de puesta en valor de la red eléctrica. Hay un diálogo constante con la distribuidora pero aún no han traído una solución al problema de baja tensión en Lago de Manzanares.

Por otra parte, C&G continúa las tareas de puesta en valor de los pilares de iluminación del barrio. Se está pronto a concluir con el revoque en los más de 200 pilares y prontamente continuarán con la colocación de un revestimiento acorde. Han reconstruido varios pilares destruidos previamente y han reemplazado cajas de alimentación en los casos que fue necesario.

A su vez, se continúan las tareas de reparación de la red de alumbrado en el barrio por parte de TECNAO. Se ha terminado de colocar farolas de iluminación nuevas en toda la zona central del barrio y se han colocado farolas también en la zona lindera al arroyo Las Flores. Se han comenzado con trabajos de zanjeo en el barrio para reemplazar los conductos que se encontraban dañados. La línea de alumbrado en el barrio se encontraba con serios problemas en la ejecución, por lo que hubo un trabajo de sectorización previo al zanjeo actual. Se dejará en condiciones el lado izquierdo del barrio para luego continuar con el lado derecho, pasando el puente.

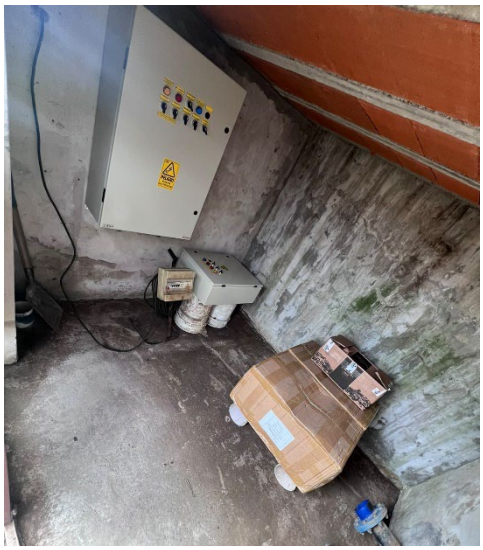
Desde dirección de obra les pedimos que se le permita trabajar a ambas contratistas (C&G y TECNAO) durante el día. En caso de necesitar intervención en farolas alimentadas por las casas o en los pilares con medidores activos, se le notificará debidamente a los vecinos.

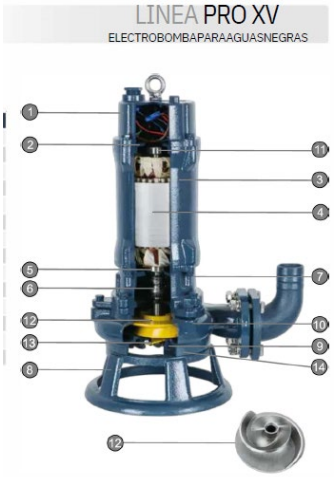
Se van detectando fallas nuevas a la par de que se trabaja, por lo que puede haber cambios en los sectores iluminados a medida que se repara.

RED CLOACAL

CONCEPTO	EMPRESA/CONTRATISTA	ESTADO
Normalización de la red cloacal	SIDCO	En proceso
Equipamiento de Plante de Tratamiento y Estación Elevadora	INGENAT	En proceso
Obra Civil en la PTE	A definir	En licitación

Imágenes:

Tablero Ppal instalado en la Planta de Tratamiento	Cañerías instaladas en el tramo cercano a la Rotonda
	
Zanjeo y tendido de tramo cloacal	

	
“Cojinete” ejecutado	Folleto de bombas empleadas en la PTE
	

Notas:

Se ha concluido con las tareas de reparación del tramo cloacal en la zona cercana a la rotonda. Se reemplazo el tendido mal ejecutado y se han instalado tramos nuevos con una compactación acorde. Además, SIDCO ha realizado reparaciones aisladas en otros sectores del barrio.

Queda pendiente la desobstrucción del conducto que culmina en la Planta de Tratamiento (o el eventual reemplazo del mismo).

Ya se cuentan con los equipos necesarios para poder utilizar la Planta de Tratamiento y ambas Estaciones Elevadoras. Se han traído al barrio para poder colocarlos en la brevedad y comenzar a tratar efluentes cloacales. Se han contratado camiones atmosféricos para desobstruir la red cloacal interna.

En la brevedad se enviará la licitación para la obra civil a realizar en la planta de tratamiento, que permitirá aumentar la capacidad de efluentes a tratar. Será necesario un laberinto de cloración nuevo, un sedimentador funcional y un digestor de lodos nuevo. Ya se cuenta con el proyecto estructural, resta ultimar detalles del sistema de tratamiento planteado.

RED DE AGUA POTABLE

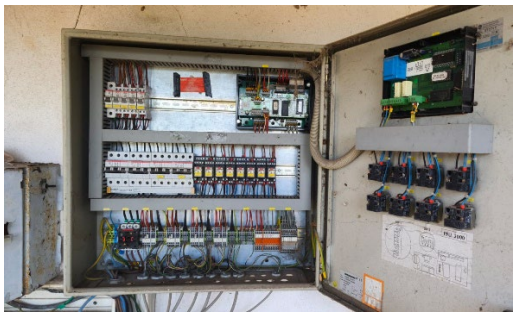
CONCEPTO	EMPRESA/CONTRATISTA	ESTADO
Reparación de pérdidas puntuales en la red – Zona Norte	MH y SIDCO	En proceso

Notas:

Tras varias reparaciones de la red de agua, se han encontrado las últimas fallas y en primera instancia parecieran no haber más detecciones. Por lo pronto, la presión de la red permanece estable con la bomba sumergible instalada.

Se ha realizado un relevamiento de la red y se han encontrado discrepancias con los planos existentes del barrio. Por ello, se realizará un relevamiento en detalle de la red existente para corregir la documentación.

Imágenes:

<table>
<tr><td colspan="2">Estado anterior del cuarto de bombeo</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>Conexión troncal reparada</td><td>Conexión troncal reparada</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
</table>

SEGURIDAD

CONCEPTO	EMPRESA/CONTRATISTA	ESTADO
Cercado del perímetro	LEGUIZAMÓN ALAMBRADOS	En proceso
Sistema de Seguridad Integral	A definir	En licitación

Notas:

Se ha enviado la licitación para el servicio de seguridad integral en el barrio a distintos contratistas y se esperan propuestas técnicas y económicas. Se buscarán opciones de videovigilancia, monitoreo y control de accesos y demás cuestiones relacionadas a la seguridad del barrio, acorde al proyecto Lago de Manzanares.

Se continúan con las tareas de cercado en el perímetro del barrio. Han cercado aproximadamente 3700 metros lineales de alambrado perimetral y hay unos 3500 metros amurados. Resta una parte para completar toda la Etapa 1.

Además, los 3 portones de entrada al barrio cuentan con alimentación en la actualidad.

Imágenes:

Portón de acceso instalado	Frente del barrio cercado
	

Trabajos de Cercado en el perímetro del barrio	
	

A su vez, se tiene un acopio de materiales generales en las cercanías de la entrada del predio, dónde se tiene vigilancia cercana en la mayor parte del día. Aquí se irán almacenando materiales que resulten necesarios para las tareas a desarrollar.



Acopio de materiales y Emplazamiento de obradores

MANTENIMIENTO

CONCEPTO	EMPRESA/CONTRATISTA	ESTADO
Parquización	MANTENIMIENTO DÍAZ	En proceso
Limpieza Zona Sur	ND Vial	En proceso

Paisajismo	Be Garden	En proceso

Imágenes:

Imágenes del avance de mantenimiento en Zona Norte y plantación	
	
	

Notas:

Se continúa con trabajos de mantenimiento y desmalezamiento en toda la Zona Norte del desarrollo.

Se han realizado limpiezas en la cercanía del arroyo Las Flores de manera momentánea, para mejorar la circulación. Tras un relevamiento efectuado del arroyo, se han detectado desniveles importantes en el fondo que perjudican la circulación aguas abajo. Se deberán realizar mejoras en este arroyo para favorecer el desagüe.

Se continúa trabajando en el sector Sur del barrio, realizando la limpieza de este para intervenirlo posteriormente, con un movimiento de suelos acorde. Esta tarea llevará un tiempo

considerable, por lo que se pide no circular por la zona Sur del barrio dado que habrá máquinas trabajando constantemente. Se ha colocado señalización para impedir el movimiento.

Se continúa con la ejecución del proyecto paisajístico tras concretar la plantación de más de 700 árboles en los frentes de lote. Además, se han realizado plantaciones de árboles en diversos sectores verdes de la Etapa Norte.

AGRIMENSURA / TOPOGRAFÍA

Se han marcado con estacas los límites del cerco por lo que se pide precaución al circular por el perímetro del predio. Por otro lado, los puntos fijos que se ven en el barrio están siendo utilizados como referencia por varias contratistas.

Puntos Azules: Puntos Fijos para efectuar el relevamiento topográfico.

Estacas de madera: Delimitación del cerco perimetral.

Se muestra un ejemplo:



Se avanzan con gestiones municipales y provinciales para poder contar con la documentación necesaria en todos los lotes del barrio (tanto para la Etapa Norte como para la Etapa Sur).

VIALIDADES

CONCEPTO	EMPRESA/CONTRATISTA	ESTADO
Proyecto Vial – Zona Norte	PEESA	Completado
Proyecto Vial – Zona Sur	PEESA	En proceso
Vialidades internas – Zona Norte	ZAMVIAL	En proceso

Ha comenzado la obra de vialidades internas de la Etapa Norte del barrio. ZAMVIAL, por lo pronto, ha realizado un mejoramiento de la subrasante con cal en todo el sector izquierdo del

barrio. Se ha realizado un replanteo topográfico y se ha excavado con maquinaria vial hasta los niveles determinados por proyecto.

A la par, se van reemplazando caños pluviales deteriorados y realizando una compactación luego de esta instalación.

Dado que se trata de una obra de gran envergadura, se realizarán las comunicaciones acordes para notificar los sectores por los que se irá avanzando. Desde la Dirección de Obra enviaremos una secuencia de calles a intervenir para notificar a los vecinos la circulación recomendada de manera temporal.

Reclamado de la subrasante con cal	Tendido de caños pluviales Hel Cor
	
	

AMENITIES

CONCEPTO	EMPRESA/CONTRATISTA	ESTADO
Canchas de tenis y pádel	Marino Tenis	En proceso
Cancha de fútbol	Díaz Mantenimiento	En proceso
SUM	Construcciones Báez	En proceso

Notas:

Se ha comenzado con la obra del SUM, que modernizará el antiguo House del barrio para generar un lugar de reuniones a futuro. En este sentido, se comparten algunas imágenes del avance:









Se concluyó con la demolición y se comienzan con tareas de mejora en todo el recinto.

En sintonía con esto, se ha contratado la construcción de 2 canchas de pádel con césped sintético y 2 canchas de tenis del tipo rápidas. Estas se hallarán en frente al futuro House proyectado y conformarán el primer avance en lo que será la zona común del barrio, dónde se espera un lugar de encuentro y actividad social a futuro entre todos los vecinos de la comunidad.

Hasta el momento se ha avanzado con los paquetes estructurales para ambas canchas:





Movimiento de Suelos en las canchas de Tenis y Pádel

PROYECTOS

- Edificio de acceso principal
- Planta de Tratamiento
- House

Se están realizando las gestiones acordes para comenzar con las intervenciones civiles de las obras anteriormente mencionadas. Se avanza en conjunto con profesionales (Arquitectos, calculistas, etc.) para tener un proyecto conformado que cumpla con la estética y los requerimientos del barrio a futuro.

La Planta de Tratamiento de Efluentes comenzará su obra en la brevedad. Secuencialmente lo harán el edificio de acceso principal y el House proyectados, pendientes de aprobaciones municipales para su realización.



Edificio de entrada en la actualidad
